

"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

## DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA


MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA  
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO.  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.

Villa María, 10 de Mayo de 2016.


REFERENCIA: LOTE O SANTA TERESA  
EXPEDIENTE. N°: 0038351.Letra "S".

### ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA.

A través de la presente se deja constancia de la recepción definitiva de la obra correspondiente a las instalaciones de A° Público, del loteo de referencia "SANTA TERESA". Según planimetría adjunta, a entera satisfacción de este Municipio.




MR. JORGE ALBERTO CASSAM  
Municipalidad de V. María

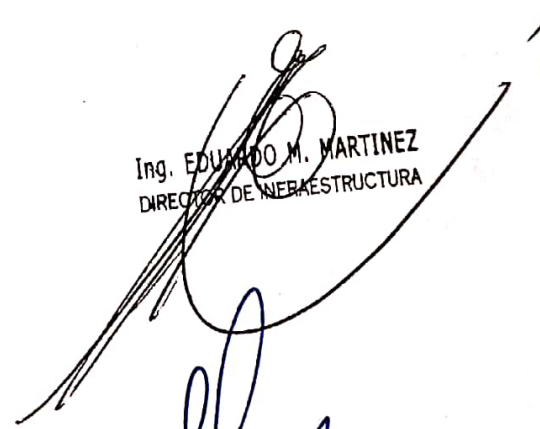

Ing. EDUARDO M. MARTINEZ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

CERTIFICO: Que la presente fotocopia es fiel  
de su original que he tenido a la vista. Doy fe.  
Villa María 22 de Abril de 2021



JULIAN LOZITA  
Escribano Adscripto - Reg. 476  
VILLA MARÍA (CBA.)

2

CONDICIONES TÉCNICAS DE PROYECTO		SIMBOLOGÍA	
NUMERO DE CLIENTES SOLICITANTES	81	CARGETA A INSTALAR	
CAUDAL MAX. A SUMINISTRAR POR CLIENTE (m <sup>3</sup> /h)	61	CARGETA EXISTENTE	
PRESION DE SUMINISTRO MAXIMA (kg/cm <sup>2</sup> M)	3,5	TAPA CIEGA	—D—
PRESION DE SUMINISTRO MINIMA (kg/cm <sup>2</sup> M)	1,5	PUNTO DE CONEXION	—○—
PRESION DE PRUEBA DE RESISTENCIA (kg/cm <sup>2</sup> M)	0,5	ACCESORIO TIPO WILLIAMSON	—+—
PRESION DE PRUEBA DE HERMETICIDAD (kg/cm <sup>2</sup> M)	6,0	VALVULA A INSTALAR	—v—
GAS DORRIZADO	SI	VALVULA EXISTENTE	—v—
		REDUCCION CONCENTRICA	—D—
		CAÑO CAMISA CON VENTOS	—C—
		PLANTA REDUCTORA DE PRESION	—R—

**NOTAS :**

- LOS DIAMETROS NO ESPECIFICADOS SON DE 50 mm.
- SE DEBERA CONSTRUIR LA RED DE ACUERDO AL CUERPO NORMATIVO SOBRE REDES DE DISTRIBUCION HASTA 4 bar DE GASES DE PETROLEO Y MANUFATURADOS (NORMA MAG 121 A MAG 140), MAG 100, MAG 153 Y PLANOS TIPO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CUALSQUIER GENERALES DE LA DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.
- PREVILO AL INICIO DE LA OBRA, SE DEBERA CUMPLIMENTAR CON LOS REQUISITOS DEL ENARGAS (RESOL. 10/83 o 44/94) SEGUN CORRESPONDA.
- LA CARGERA PROYECTADA DEBE CUBRIR INTEGRALMENTE TODOS LOS LOTES INCLUIDOS EN EL PROYECTO.
- TODOS LOS MATERIALES PARA LA CONCRECION DE LA OBRA SERAN PROVISOS E INSTALADOS POR LOS INTERESADOS.

**NOTA :**

-LAS CANTIDADES DESCRIPTAS EN LA LISTA DE MATERIALES SON INDICATIVAS Y DEBERAN SER VERIFICADAS POR EL CONTRATISTA PARA UNA CORRECTA PRESUPUESTACION.

Nº	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	Material
22	VALVULA ESFERICA #90mm CON EXTENSOR, SEGUN PT 10059	MAG 133	1	
21	ACCESORIO DE TRANSICION AC-PE #76/90mm	MAG 132	1	
20	ACCESORIO DE TRANSICION AC-PE #51/63mm	MAG 129	170	
19	ACCESORIO DE TRANSICION AC-PE #38/50mm	MAG 129	640	
18	SERVICIO INTEGRAL DE T.E. #25mm, SEGUN GI/RG 10073 Y AM/MAG 5001	MAG 136	61	

Nº	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	Material
04	VALVULA ESFERICA #102mm C/EXTENSOR-EXISTENTE	MAG 133	1	
03	ACCESORIO DE TRANSICION AC-PE #76/90mm	MAG 132	1	
02	ACCESORIO DE TRANSICION AC-PE #51/63mm	MAG 132	1	
01	ACCESORIO DE TRANSICION AC-PE #38/50mm	MAG 132	1	
00	SERVICIO INTEGRAL DE T.E. #25mm, SEGUN GI/RG 10073 Y AM/MAG 5001	MAG 136	61	

**DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.**  
 Gerencia Técnica Operativa  
 Estudios y Proyectos

Obra: PROVISION DE G. N. A LOTELO SANTA TERESA S.R.L.  
 Lugar: B° SAN JUAN BAUTISTA-VILLA MARIA


Parte: ANTEPROYECTO DE RED DE DISTRIBUCION EN POLIETILENO

Fecha: 26-09-08  
 Vers: 26-03-08  
 Jefe Secc: [Firma]

Form: A3  
 Rev: G.G.  
 Dib. Coordinador: [Firma]

C.Op. VM  
 Tipo P  
 Clase F.  
 N° DC 00440/115

P.N.:06

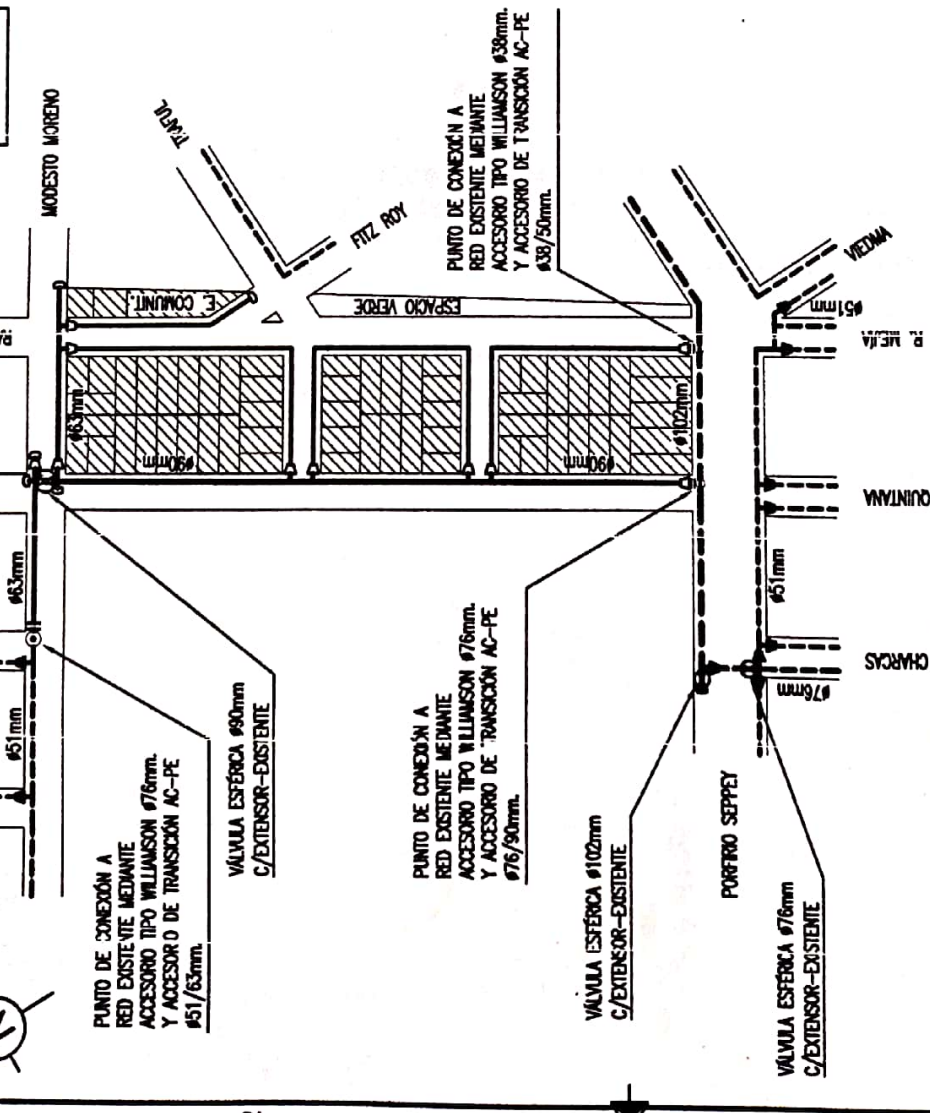

"YENCIDO EL PLAZO INDICADO EN ESTE ANTEPROYECTO Y NO HABIENDO PRODUCCION EL INICIO DE LA OBRA, SE DEBERA SOLICITAR UNA NUEVA DISPONIBILIDAD, LA QUE SE APROBARA PREVIO ANULAZO SI HAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO QUE HAGAN NECESARIA LA ADJUDICACION DE LAS OBRAS PARA PROMOVER DICHO CONSUMO"

"A TODO EVENTO SE HACE PRESENTE QUE ESTA DISPONIBILIDAD SE OTORGA EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA NOTA ENRG N°4568/04 (09/09/04) Y SE ENCUENTRA CONDICIONADA A LA EFECTIVA DISPONIBILIDAD DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE ADICIONAL CONFORME ASIGNACION DEL ENARGAS EN EL MARCO DEL CONCURSO ABIERTO TON N°01/2005 Y A LA SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE GAS NATURAL ASIGNADA A ESTA LICENCIATURA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ENERGIA O AUTORIDAD COMPETENTE".

**NOTAS:**

- PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DEBERAN OBTENERSE LAS AUTORIZACIONES DE PASO O CONVENIOS, ANTE LOS ORGANISMOS Y/O PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS, SEGUN CORRESPONDA.
- PREVIO AL INICIO DE LA OBRA SE DEBERAN REALIZAR TODAS LAS GESTIONES ANTE LOS ORGANISMOS JURISDICCIONALES COMPETENTES, PARA LA OBTENCION DE LOS PERMISOS RESPECTIVOS (MUNICIPIO, D.N.V., D.P.V., D.P.H., F.F.O.C., ETC.).

2
